

DIEGO BOCANEGRA LEAL

HOJA DE RESUMEN DE ESTIMACIONES


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACIÓN (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSABLE:	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO ESTIMACIÓN: 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

PARTIDA	HOJA NUM.	IMPORTE CONTRATADO	TOTAL POR PARTIDA		
			ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO
SEGÚN PRESUPUESTO					
REMODELACIÓN					
PRELIMINARES		\$ 22,620.74	\$ -	\$ 4,973.54	\$ 4,973.54
CANCELERIA		\$ 163,828.73	\$ 13,079.70	\$ 163,828.73	\$ 176,908.43
ALBAÑILERIA		\$ 187,391.57	\$ 22,374.09	\$ 182,275.08	\$ 204,649.17
INSTALACIONES ELECTRICAS		\$ 60,508.78	\$ 209.76	\$ 59,776.24	\$ 59,986.00
ACABADOS		\$ 97,584.73	\$ 10,173.38	\$ 70,932.22	\$ 81,105.60
MUEBLES Y ACCESORIOS		\$ 48,752.81	\$ -	\$ 48,752.81	\$ 48,752.81
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		\$ 34,523.86	\$ -	\$ 34,523.86	\$ 34,523.86
LIMPIEZA		\$ 8,957.85	\$ -	\$ 3,026.19	\$ 3,026.19
AIRE ACONDICIONADO		\$ 12,051.27	\$ -	\$ 12,051.27	\$ 12,051.27
IMPERMEABILIZANTE		\$ 11,008.51	\$ -	\$ 9,952.71	\$ 9,952.71
HERRERIA		\$ 12,828.20	\$ -	\$ 12,823.71	\$ 12,823.71
SUBTOTAL		\$ 660,057.04	\$ 45,836.93	\$ 602,916.36	\$ 648,753.28
16% DE I.V.A.		\$ 105,609.13	\$ 7,333.91	\$ 96,466.62	\$ 103,800.53
TOTAL		\$ 765,666.16	\$ 53,170.84	\$ 699,382.97	\$ 752,553.81

EL IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN ES DE: \$53,170.84 CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 84/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE:		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:		CONTRATISTA DIEGO BOCANEGRA LEAL DIEGO BOCANEGRA LEAL REPRESENTANTE LEGAL  ING. ANDRES PIEDRA RIVERA COORDINADOR GENERAL EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS LIC. ALEJANDRINO BASTAR CORDERO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 765,666.16	IMPORTE ANTICIPO:	NO SE DIO ANTICIPO	
ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 752,553.81	AMORTIZACION ACUM.	NO SE DIO ANTICIPO	
ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 53,170.84	AMORT. DE LA PRESENTE:		
SALDO POR EJERCER:	\$ 13,112.35	SALDO POR AMORTIZAR:		

DIEGO BOCANEGRA LEAL

HOJA DE ESTIMACIÓN

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACIÓN (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA, VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSABLE:	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/API/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO	ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PRESUPUESTO	ACUMULADO	ESTA ESTIMACIÓN		
BAÑOS							
CANCELERIA							
CAN-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR DE 60 X 60 CM TIPO ARMSTRONG CERAMAGUARD BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, RETIRO DE SOBRESANTES A LUGAR AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	18.00	36.00	18.00	\$726.65	\$13,079.70
ALBAÑILERIA							
ALB-002	APLANADO DE MUROS Y/O PLAFON CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 8.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELABORACION Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACION, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	175.33	180.92	5.59	\$177.10	\$990.52
ALB-003	TABLA DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 150 KG/CM2. REFORZADO CON VR DEL NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ALMACENAJE, ACARREO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, COLOCACION, AMARRES, ELABORACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2.00	3.07	1.07	\$1,087.89	\$1,167.31
ALB-004	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CLASE I, ZONA B, A BORDE DE CEPA EN TRAMOS, INCLUYE: ACARREO HASTA UNA ESTACION DE 20.00, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, NIVELACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	6.72	7.14	0.42	\$155.74	\$65.41
ALB-005	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR, FABRICADA CON CONCRETO F'c=100KG/CM2 T.M.A DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	7.20	8.40	1.20	\$183.33	\$220.00
ALB-009	PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ACABADO SEPILLADO PARA RECIBIR LOZETA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION Y COLOCACION DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	36.00	54.00	18.00	\$322.87	\$5,811.66
ALB-010	CADENA DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE 20 X15 CM. ARMADO CON 4 VR DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @ 15 CM CONCRETO F'c= 200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO, DE ALTURA VARIABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	30.00	39.00	9.00	\$635.98	\$5,723.82
ALB-011	CADENA DE CONFINAMIENTO INTERMEDIO CON DIMENSIONES DE 12 X 12 CM. ARMADO3 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @20 CM CONCRETO F'c= 200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO, DE ALTURA VARIABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	9.00	15.00	6.00	\$568.63	\$3,411.78
ALB-012	CASTILLO CON DIMENSIONES DE 15 X15CM. ARMADO CON ARMEX 12X12-4 REFORZADO CON 2 VR 3/8 CONCRETO F'c= 200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO, DE ALTURA VARIABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	36.00	46.20	10.20	\$321.00	\$3,274.20

ADMINISTRADOR UNICO
DIEGO BOCANEGRA LEAL

COORDINADOR GENERAL EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

DIEGO BOCANEGRA LEAL

HOJA DE ESTIMACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA, VILLAHERMOSA, TABASCO.

AREA: SECRETERIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **LOCALIDAD:** VILLAHERMOSA, TABASCO.

CONTRATISTA: DIEGO BOCANEGRA LEAL **MUNICIPIO:** CENTRO.

CONTRATO No.: CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23 **UNIDAD RESPONSABLE:** 23300A

PROGRAMA: 2.5351E1 **OFICIO AUT. INV.** SF/AP/0045-3/2023

FONDO: 11021800 **FECHA:** 07 DE FEBRERO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO **ESTIMACIÓN:** 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"


FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PRESUPUESTO	ACUMULADO	ESTA ESTIMACIÓN		
ALB-014	ENCONFRADO PARA BAJANTE SANITARIO. ARMADO CON ARMEX 10X10 CONCRETO F'c= 150KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: DE TUBO DE PVC DE 4", SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	3.50	9.50	6.00	\$284.90	\$1,709.40
INSTALACIONES ELECTRICAS							
ELEC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRA FLEXIBLE DE LED, VOLTAJE 127V PARA LUZ INDIRECTA EN ESPEJO. INCLUYE: CABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS Y DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	10.40	11.00	0.60	\$349.60	\$209.76
ACABADOS							
ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	23.14	103.38	80.24	\$126.79	\$10,173.38
						SUBTOTAL	\$45,836.93
						IVA	\$7,333.91
						TOTAL	\$53,170.84

ADMINISTRADOR UNICO

 DIEGO BOCANEGRA LEAL

COORDINADOR GENERAL EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS


 ING. ANDRÉS PIEDRA RIVERA.


DIEGO BOCANEGRA LEAL

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACIÓN (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.
 AREA: SECRETERÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALIDAD: VILLAHERMOSA, TABASCO.
 CONTRATISTA: DIEGO BOCANEGRA LEAL MUNICIPIO: CEN'RO.
 CONTRATO No.: CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23 UNIDAD RESPONSABLE: 23300A
 PROGRAMA: 2.5351E1 OFICIO AUT. INV. SF/AP/0345-3/2023
 FONDO: 11021800 FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023 PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO ESTIMACIÓN: 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	TOTAL
DIEGO BOCANEGRA LEAL									
CANCELERÍA									
CAN-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR DE 60 X 60 CM TIPO ARMSTRONG CERAMAGUARD BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, RETIRO DE SOBANTES A LUGAR AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2		BAÑO MUJERES	6.00	3.00		18.00	18.00
				BAÑO HOMBRES	6.00	3.00		18.00	18.00
								SUBTOTAL =	36.00
								VOL. CONTRATO =	18.00
								VOL. ESTIMACION 3 =	18.00
								VOL. ESTA ESTIMACION =	18.00
								VOL. ACOMULADO =	36.00



SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS



SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 1 DE 7



RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SANCHEZ GARCÍA

DIEGO BOCANEGRA LEAL

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACIÓN (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA, VILLAHERMOSA, TABASCO.

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALIDAD: VILLAHERMOSA, TABASCO.

AREA: CONTRATISTA: DIEGO BOCANEGRA LEAL MUNICIPIO: CEN'TRO.

CONTRATO No.: CO-UJAT-SSA-AD(2-ES/23 UNIDAD RESPONSABLE: 233001A

PROGRAMA: 2.5351E1 OFICIO AUT. INV. SF/AP/0345-3/2023

FONDO: 11021800 FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO ESTIMACIÓN: 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	TOTAL
ALB-004	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CLASE I, ZONA B, A BORDE DE CEPÁ EN TRAMOS, INCLUYE: ACARREO HASTA UNA ESTACION DE 20.00, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, NIVELACION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3		ZAPATA CORRIDA	6.00	0.85	0.85	4.34	4.34
				ZAPATA CORRIDA	3.00	0.85	0.85	2.17	2.17
				ZAPATA AISLADA	0.50	0.50	0.85	0.21	0.21
				ZAPATA AISLADA	0.50	0.50	0.85	0.21	0.21
				ZAPATA AISLADA	0.50	0.50	0.85	0.21	0.21
SUBTOTAL =								7.14	
VOL. CONTRATO =								6.72	
VOL. ESTIMACION 1 =								6.72	
VOL. ESTA ESTIMACION =								0.42	
VOL. ACOMULADO =								7.14	
ALB-005	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESFESOR, FABRICADA CON CONCRETO F C=100KG/CM2 T.M.A DE 19MM DE 3/4" DE DIÁMETRO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2		ZAPATA CORRIDA	6.00	0.85		5.10	5.10
				ZAPATA CORRIDA	3.00	0.85		2.55	2.55
				ZAPATA AISLADA	0.50	0.50		0.25	0.25
				ZAPATA AISLADA	0.50	0.50		0.25	0.25
				ZAPATA AISLADA	0.50	0.50		0.25	0.25
SUBTOTAL =								8.40	
VOL. CONTRATO =								7.20	
VOL. ESTIMACION 1 =								7.20	
VOL. ESTA ESTIMACION =								1.20	
VOL. ACOMULADO =								8.40	



SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS



SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
PÁGINA 3 DE 7



RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

DIEGO BOCANEGRA LEAL

NÚMEROS GENERADORES

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CEN'TRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-ADC2-ES/23	UNIDAD RESPONSABLE:	23303A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2023	PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO
		ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	TOTAL	
ALB-009	PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ACABADO SEPILLADO PARA RECIBIR LOZETA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2		BAÑOS MUJERES	6.00	3.00		18.00	18.00	
				BAÑOS HOMBRERES	6.00	3.00		18.00	18.00	
				ENTORTADO AZOTEA	6.00	3.00		18.00	18.00	
								VOL. CONTRATO = 36.00		
								VOL. ESTIMACION 1 = 36.00		
								VOL. ESTA ESTIMACION = 18.00		
								VOL. ACOMULADO = 54.00		
ALB-010	CADENA DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE 20 X15 CM. ARMADO CON 4 VR DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBROIN @ 15 CM CONCRETO F'c=200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML		BAÑOS MUJERES	6.00			6.00	6.00	
					3.00			3.00	3.00	
					6.00			6.00	6.00	
					3.00			3.00	3.00	
					3.00			3.00	3.00	
					3.00			3.00	3.00	
				BAÑOS HOMBRERES	6.00			6.00	6.00	
					3.00			3.00	3.00	
					6.00			6.00	6.00	
					3.00			3.00	3.00	
								SUBTOTAL = 39.00		
								VOL. CONTRATO = 30.00		
								VOL. ESTIMACION 1 = 30.00		
								VOL. ESTA ESTIMACION = 9.00		
								VOL. ACOMULADO = 39.00		



SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS



SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
PÁGINA 4 DE 7



RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SANCHEZ GARCIA


C R O Q U I S

DIEGO BOCANEGRA LEAL


OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2023	PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO
		ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINQUITO"

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

CAN-006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR DE 60 X 60 CM TIPO ARMSTRONG CERAMAGUARD BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, RETIRO DE SOBANTES A LUGAR AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.

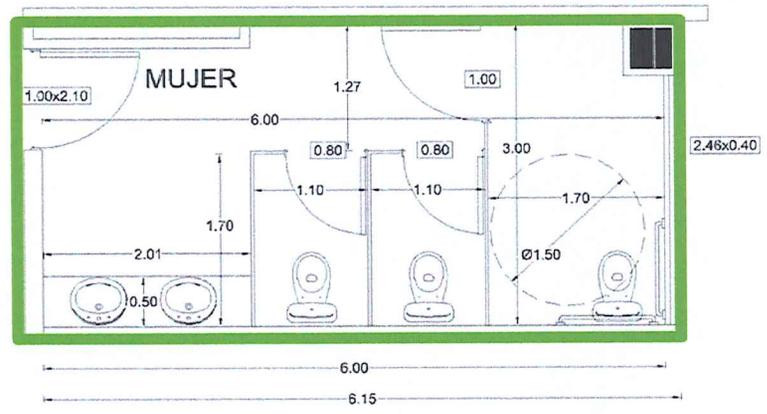

PLANTA BAJA

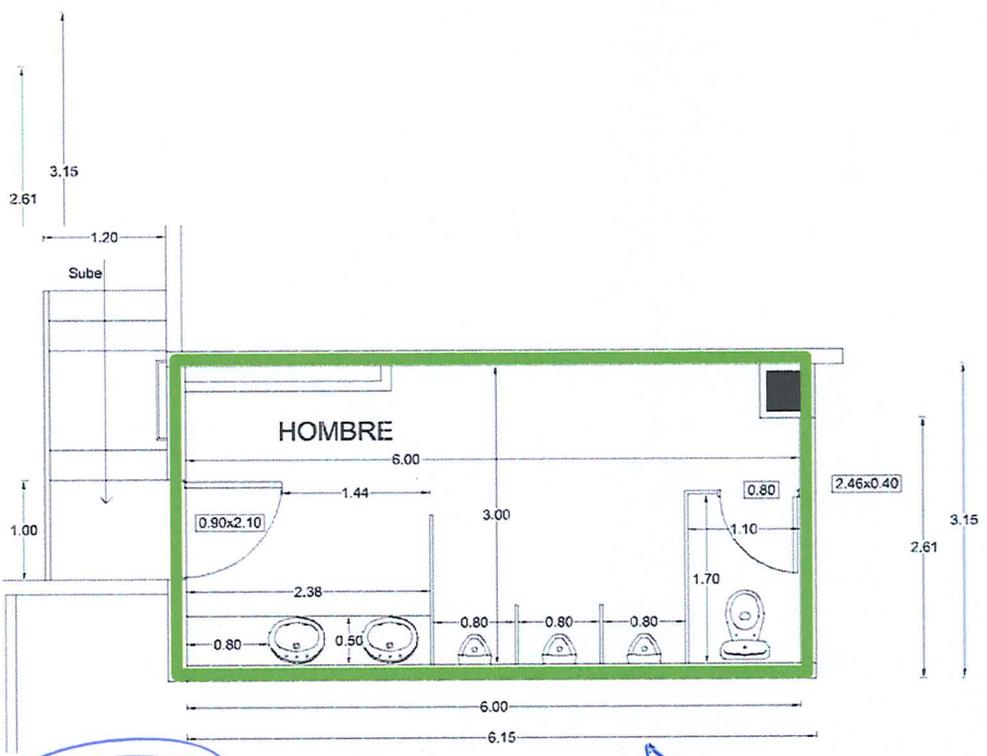

[Signature]
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 1 DE 12

[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA



C R O Q U I S

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	233300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2023	PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO
		ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "EINICUITO"

ALBAÑILERIA

ALB-002 APLANADO DE MUROS Y/O PLAFON CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 3.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

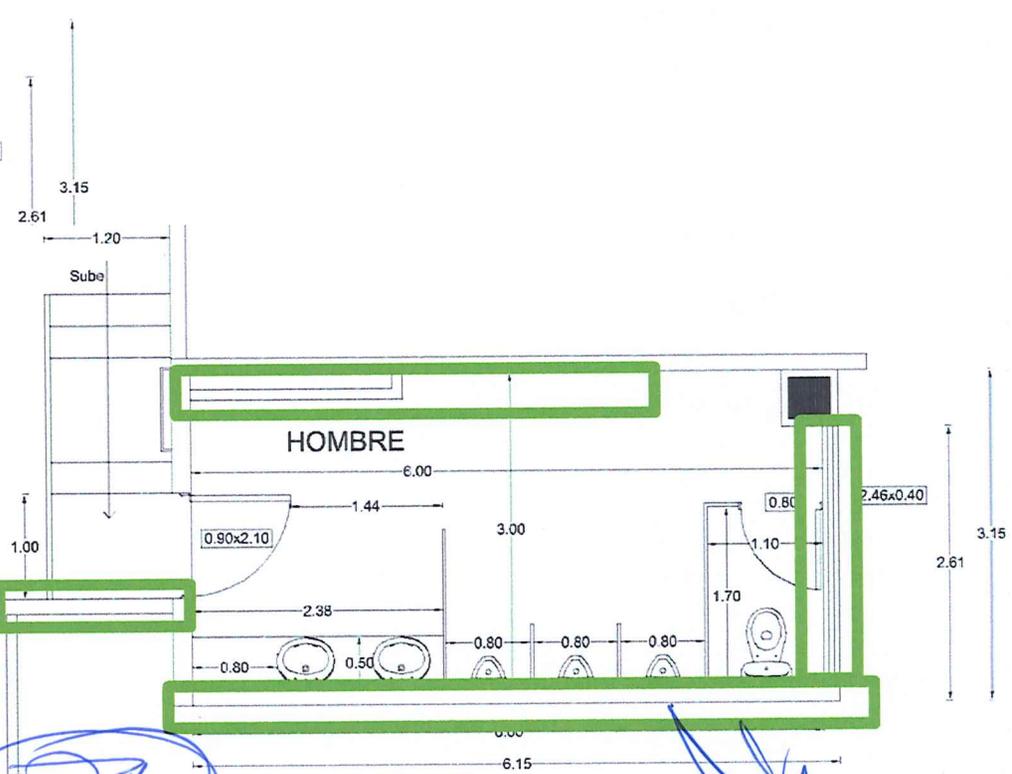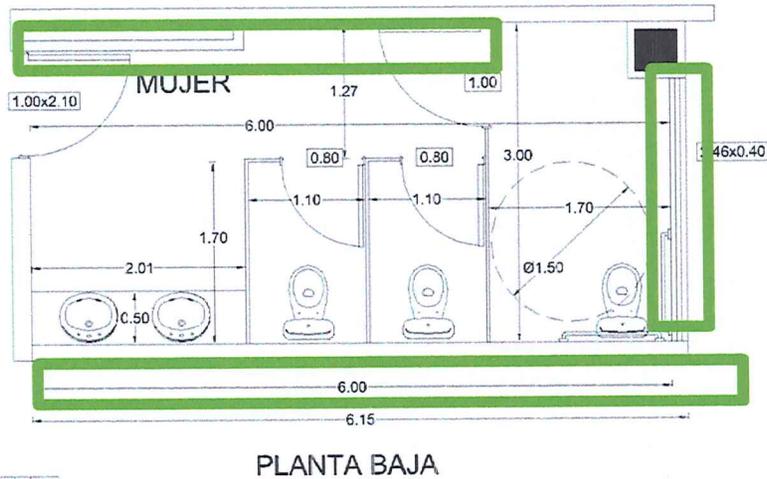

Emmanuel Bernardo Santos
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

Rodrigo Ramirez Valencia
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 2 DE 12

Vicente Sanchez Garcia
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

C R O Q U I S

DIEGO BOCANEGRA LEAL


OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CÉCOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023


PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO **ESTIMACIÓN:** 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINICLITO"

ALB-003

TABLA DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 150 KG/CM2. REFORZADO CON VR DEL N0. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ALMACENAJE, ACARREO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, COLOCACIÓN, AMARRES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

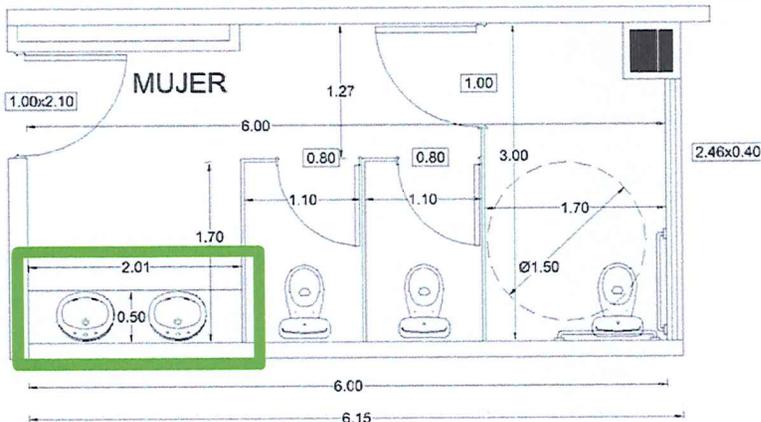

PLANTA BAJA

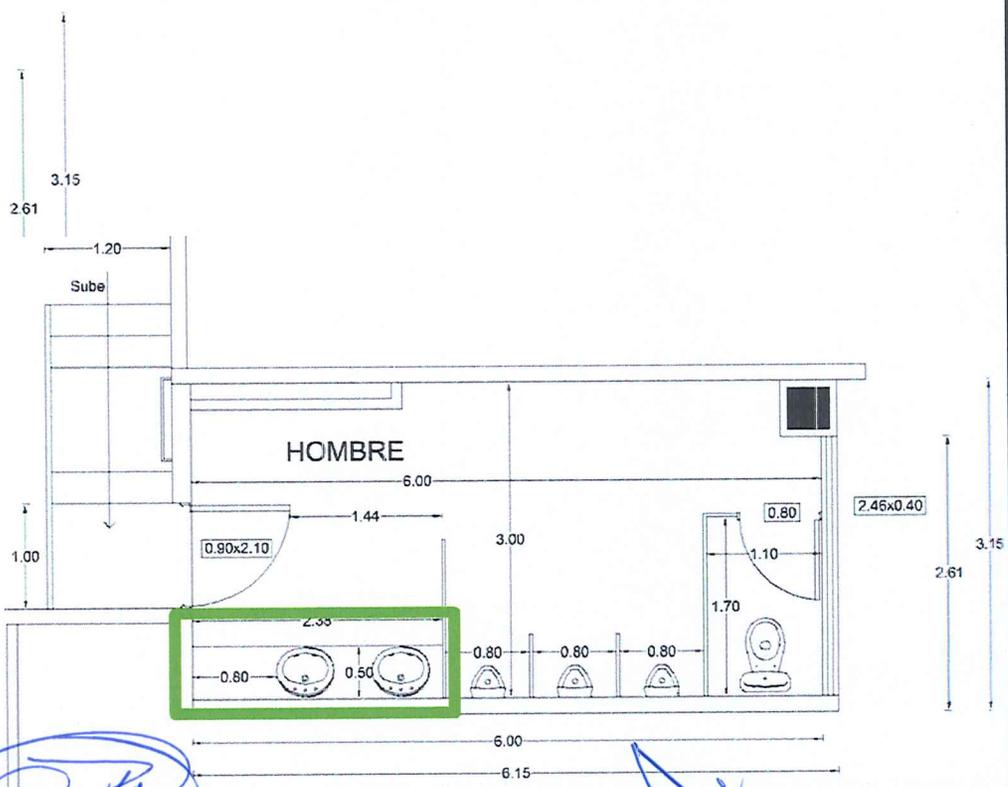

[Signature]
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
PÁGINA 3 DE 12

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SANCHEZ GARCÍA

C R O Q U I S


DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA, VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO	ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINQUITO"

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

ALB-004

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CLASE I, ZONA B, A BORDE DE CEPA EN TRAMOS, INCLUYE: ACARREO HASTA UNA ESTACION DE 20.00, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, NIVELACION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

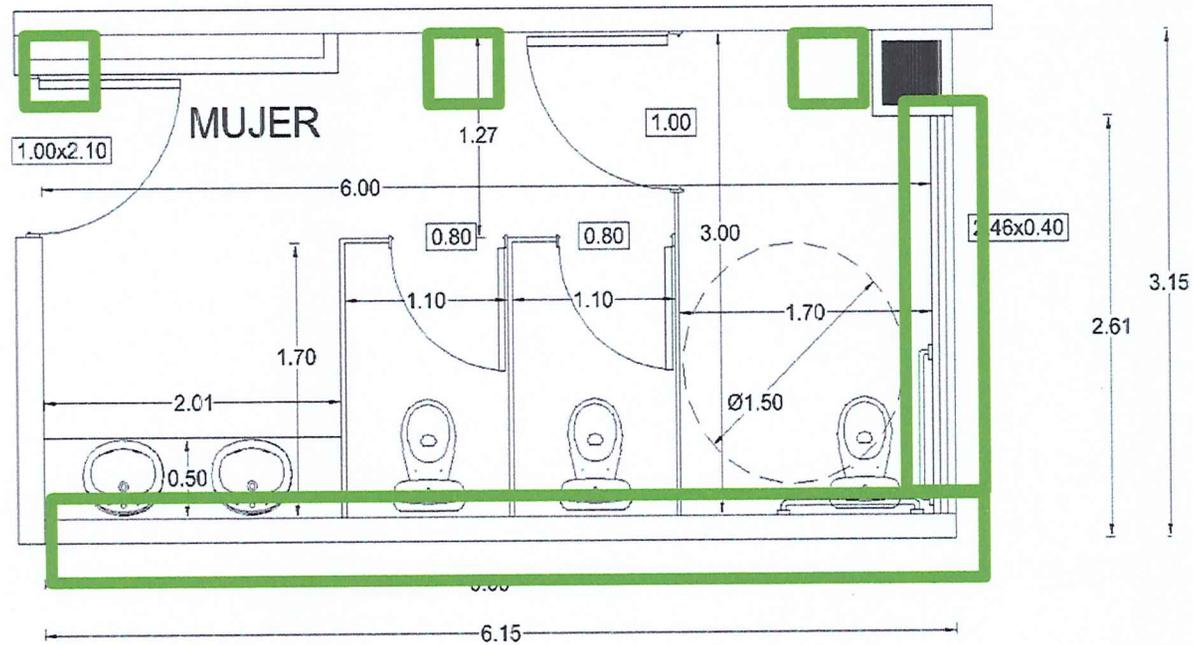

PLANTA BAJA

[Signature]
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 4 DE 12

[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SANCHEZ GARCÍA

C R O Q U I S

DIEGO BOCANEGRA LEAL


OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CC-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO **ESTIMACIÓN:** 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINQUITO"

ALB-005

PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR, FABRICADA CON CONCRETO F C=100KG/CM2 T.M.A DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

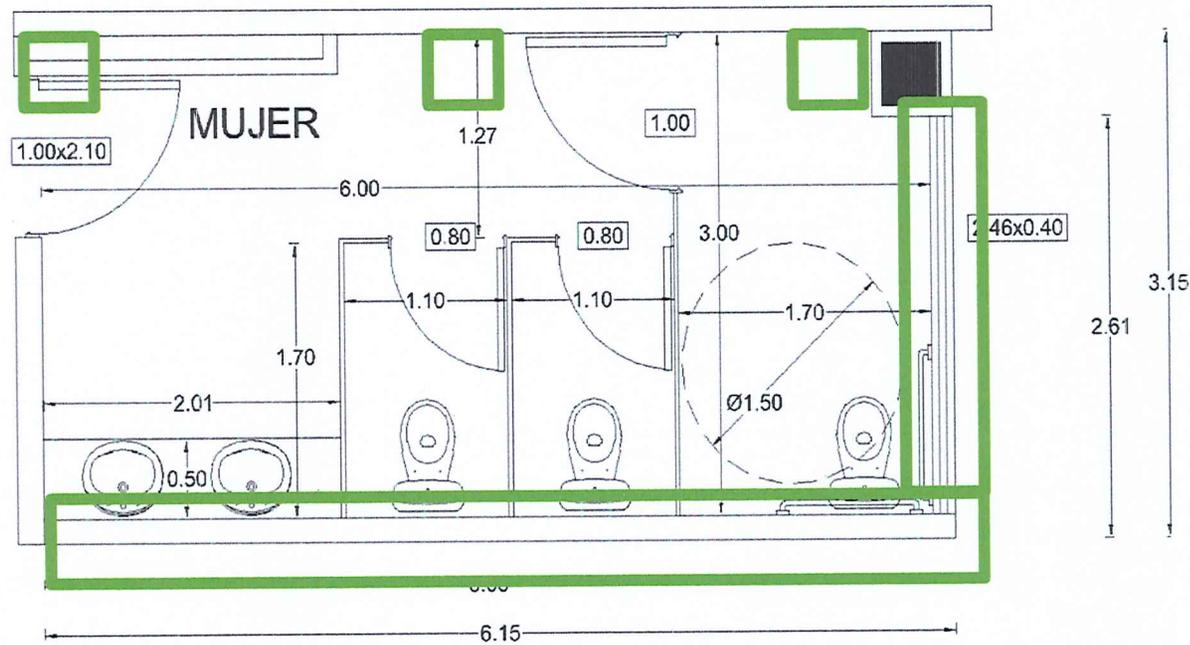

PLANTA BAJA

[Signature]
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 5 DE 12

[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

DIEGO BOCANEGRA LEAL


CROQUIS

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023


FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO ESTIMACIÓN: 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINQUITO"

ALB-009 PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ACABADO SEPILLADO PARA RECIBIR LOZETA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

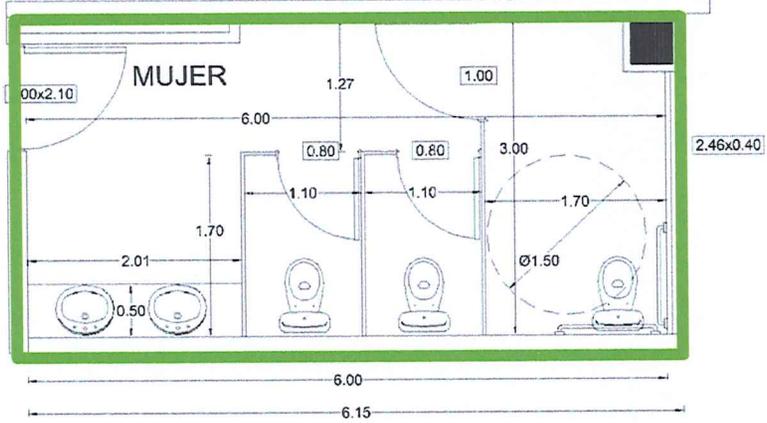

PLANTA BAJA

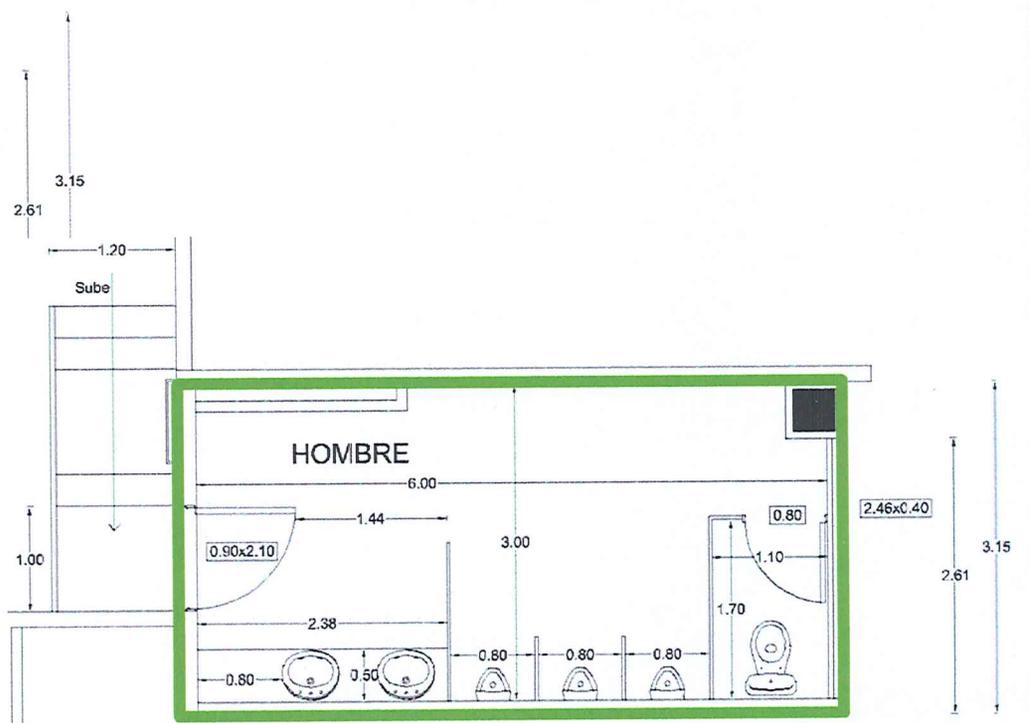

SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA

RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

C R O Q U I S

DIEGO BOCANEGRA LEAL


OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023


PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO

ESTIMACIÓN: 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINICUITO"

ALB-010 CADENA DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE 20 X15 CM. ARMADO CON 4 VR DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CM CONCRETO F'c= 200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

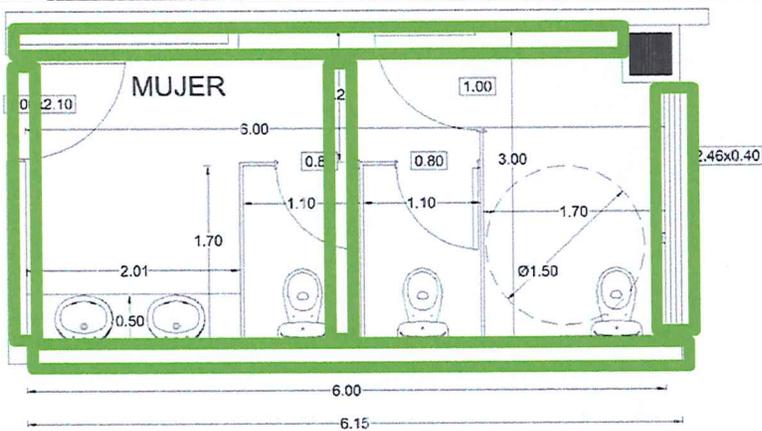

PLANTA BAJA

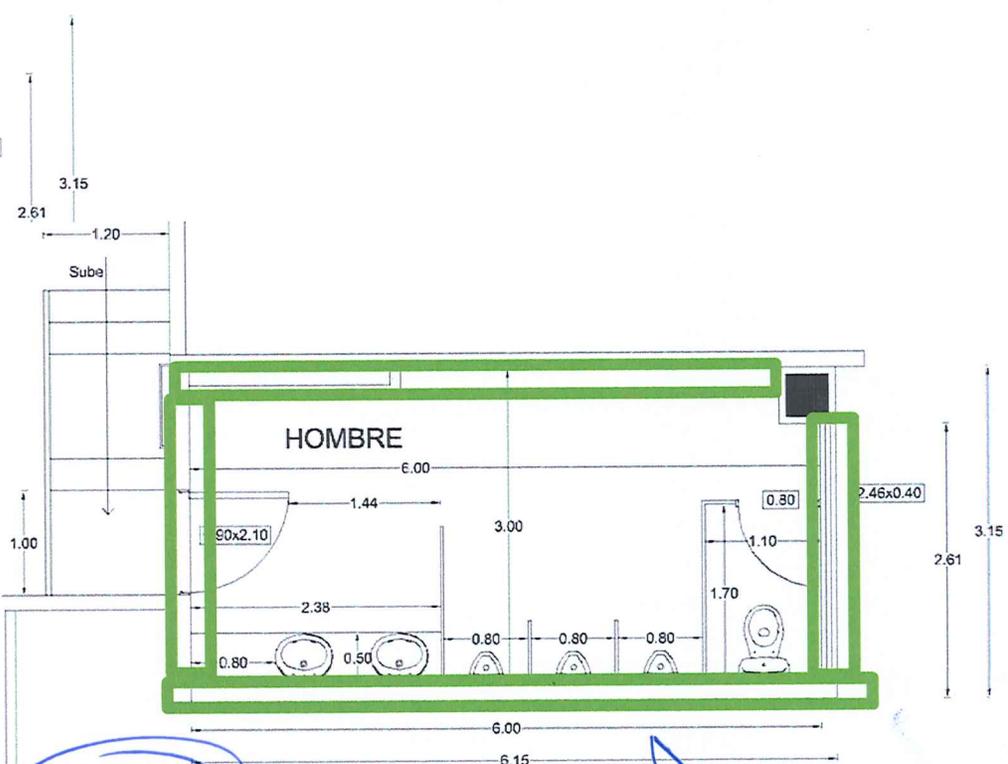

Emmanuel Bernardo Santos
SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

Rodrigo Ramirez Valencia
SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 7 DE 12

Vicente Sánchez García
RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

CROQUIS

DIEGO BOCANEGRA LEAL


OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETERIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSA:	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.:	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023


PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO

ESTIMACIÓN: 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINQUITO"

ALB-011 CADENA DE CONFINAMIENTO INTERMEDIO CON DIMENSIONES DE 12 X 12 CM. ARMADO 3 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIOS DE ALAMBRO @20 CM CONCRETO F'c= 200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

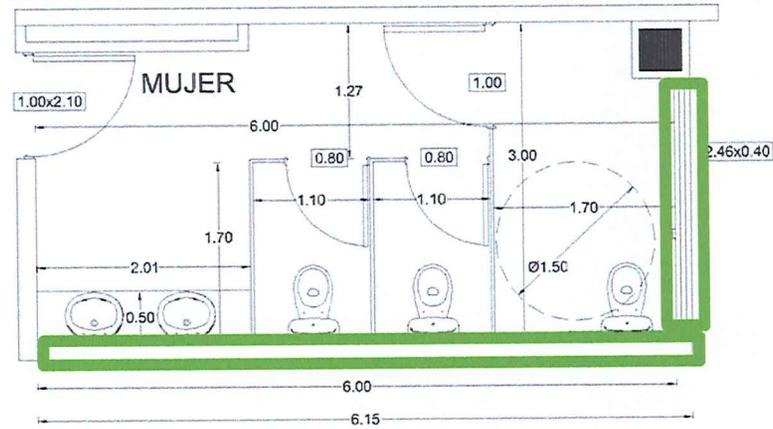

PLANTA BAJA

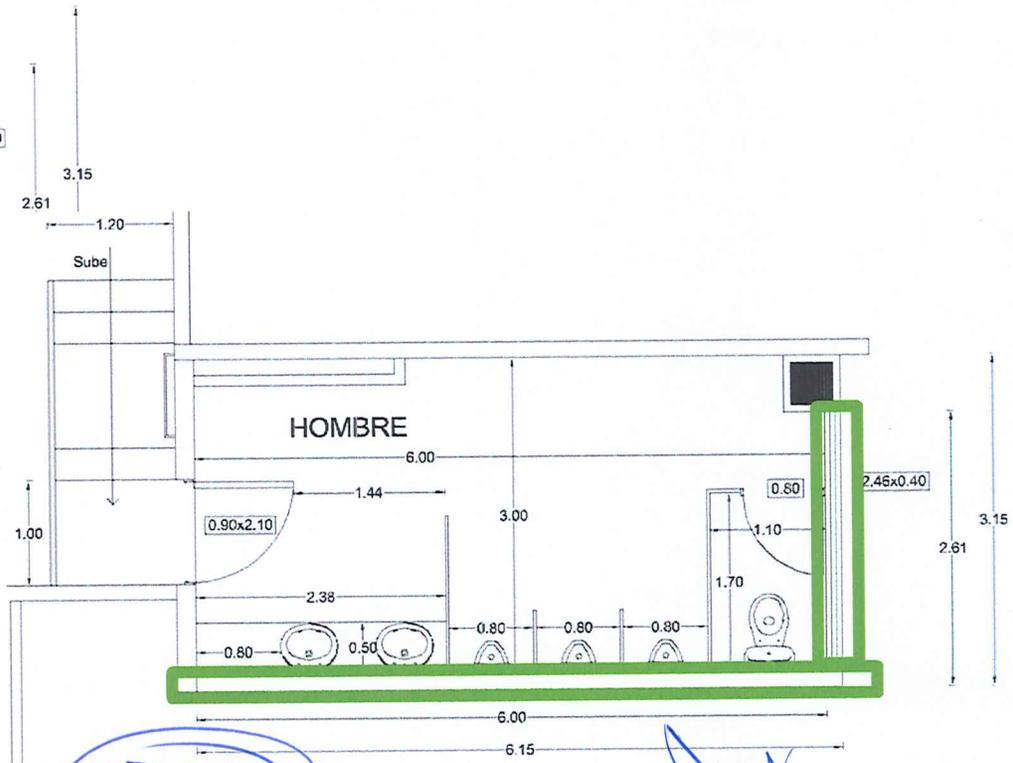

[Signature]
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 8 DE 12

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

CROQUIS


DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CÉCOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023


FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO **ESTIMACIÓN:** 04 CANTIDADES ADICIONALES "EINQUILITO"

ALB-012 CASTILLO CON DIMENSIONES DE 15 X15CM. ARMADO CON ARMEX 12X12-4 REFORZADO CON 2 VR 3/8 CONCRETO F'c= 200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

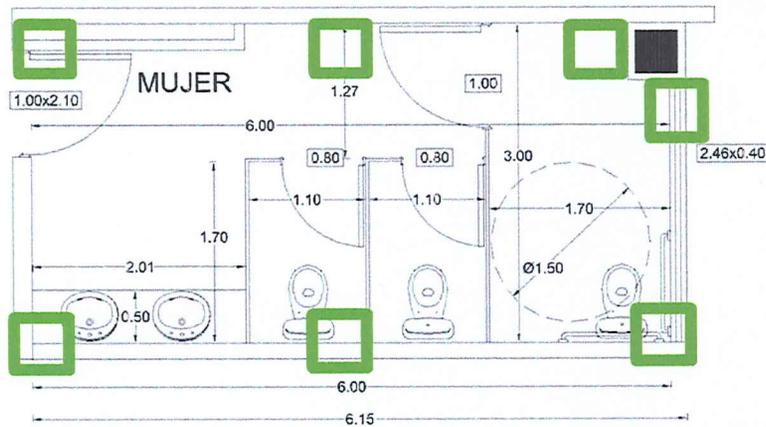

PLANTA BAJA

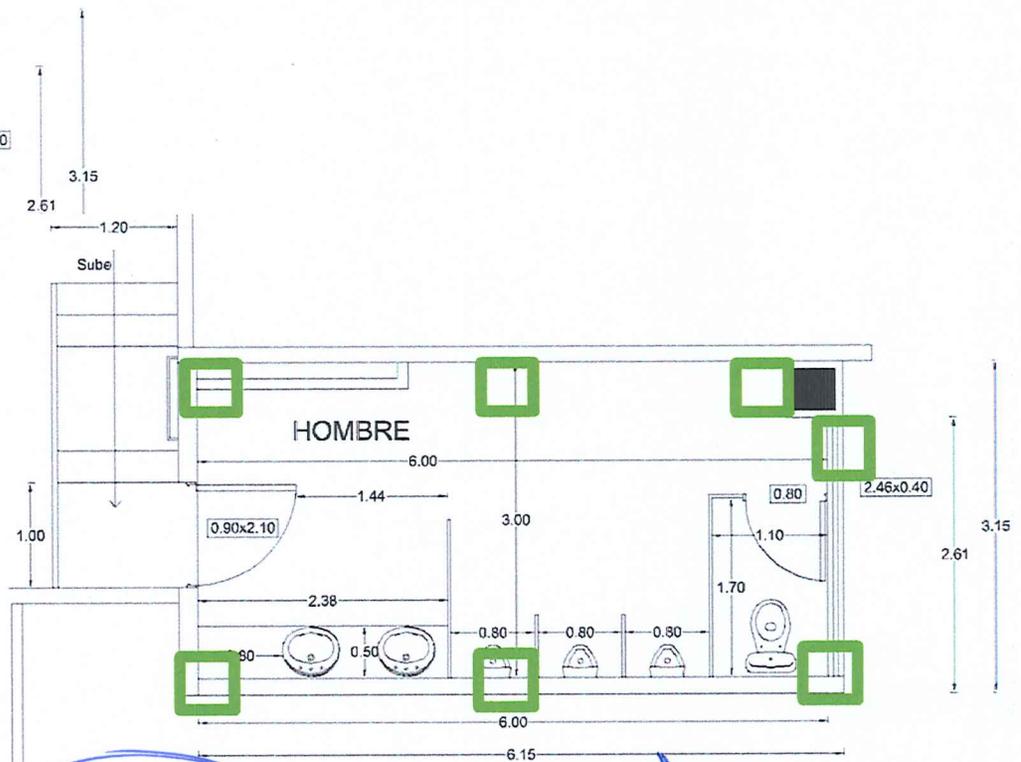

[Signature]
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 9 DE 12

[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

C R O Q U I S

DIEGO BOCANEGRA LEAL


OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO

ESTIMACIÓN: 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

ALB-014 ENCONFRADO PARA BAJANTE SANITARIO. ARMADO CON ARMEX 10X10 CONCRETO F' C= 150KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: DE TUBO DE PVC DE 4", SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

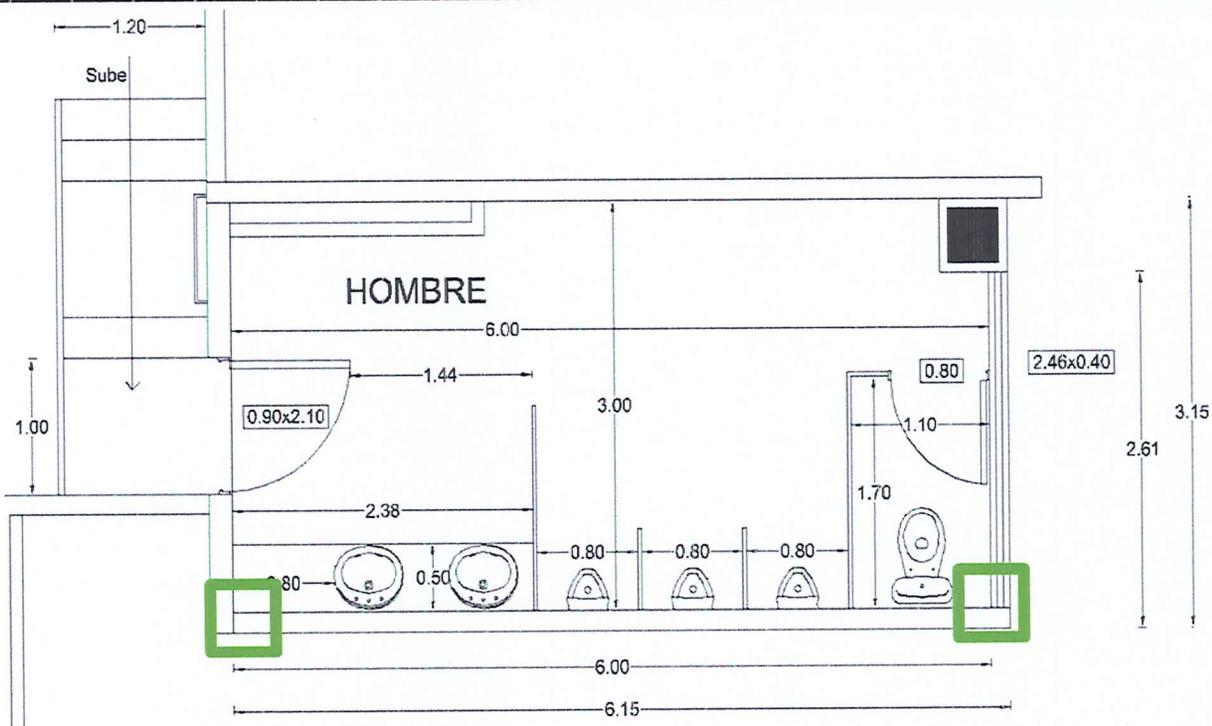

Emmanuel Bernardo Santos
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

Rodrigo Ramirez Valencia
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 10 DE 12

Vicente Sanchez Garcia
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA



CROQUIS

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETERIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	233300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2023	PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO
		ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINICLITO"

INSTALACIONES ELECTRICAS

ELEC-002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRA FLEXIBLE DE LED, VOLTAJE 127V PARA LUZ INDIRECTA EN ESPEJO. INCLUYE: CABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS Y DESPERDICIOS. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

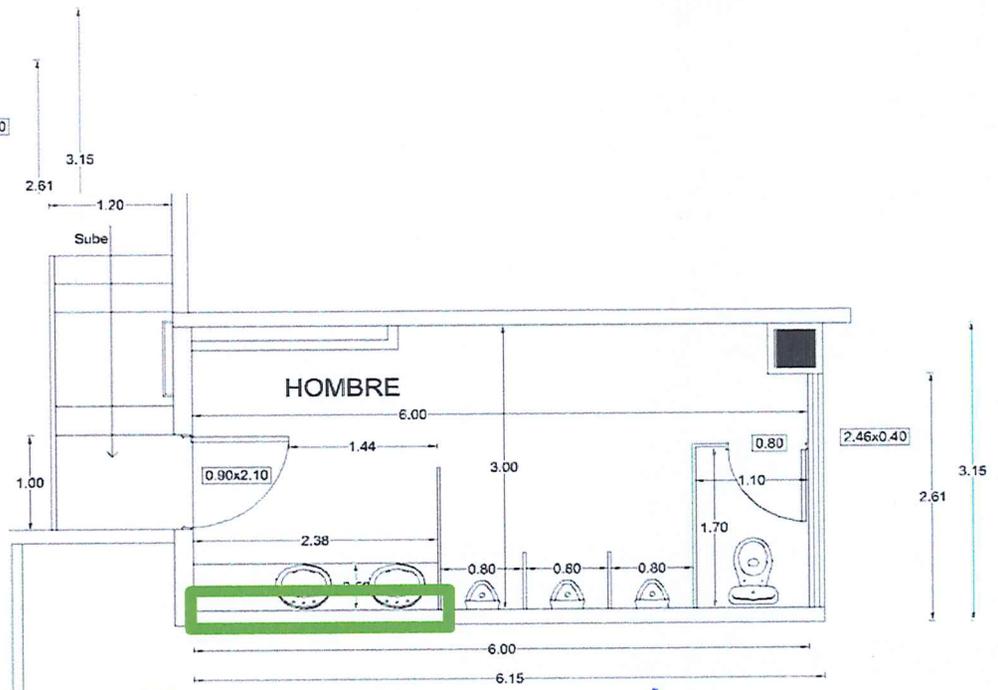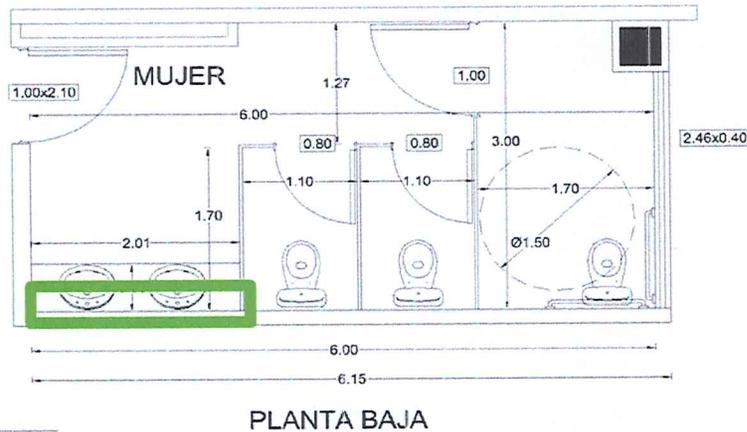

[Signature]
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 11 DE 12

[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

C R O Q U I S


DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSA:	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO	ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "ENQUILITO"


FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

ACABADOS

ACA-003 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

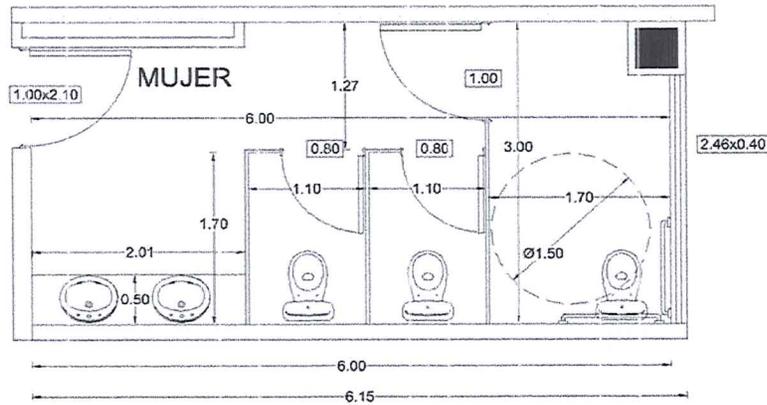

PLANTA BAJA

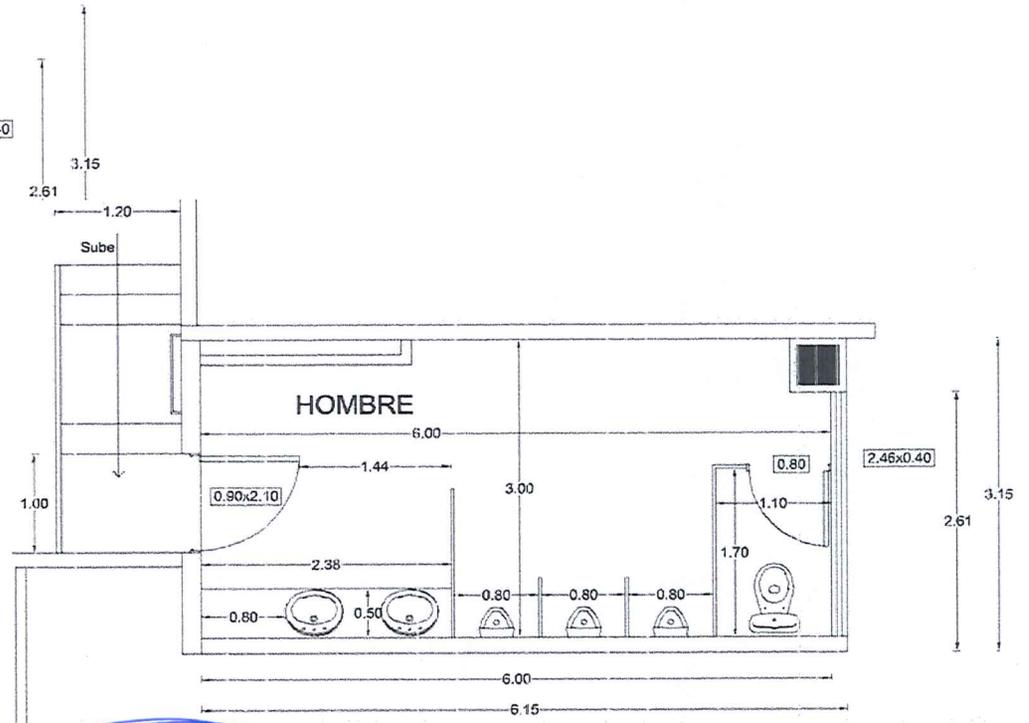

[Handwritten Signature]

SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 12 DE 12

[Handwritten Signature]

RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

[Handwritten Signature]
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

ALBUM FOTOGRÁFICO


DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO **ESTIMACIÓN:** 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

CAN-006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR DE 60 X 60 CM TIPO ARMSTRONG CERAMAGUARD BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, RETIRO DE SOBANTES A LUGAR AUTORIZADO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.

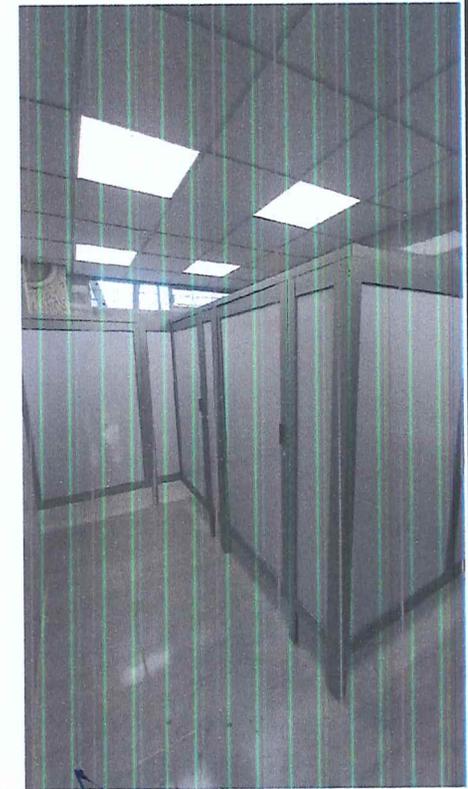

Emmanuel Bernardo Santos
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

Rodrigo Ramirez Valencia
SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 1 DE 12

Vicente Sanchez Garcia
RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SANCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2023	PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO
		ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

ALBAÑILERIA

ALB-002	<p>APLANADO DE MUROS Y/O PLAFON CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 DE 2 CM. DE ESP. PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO CON ESPONJA, HASTA 8.00 M DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN Y ACARREO DE MORTERO, NIVELACIÓN, CURADO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.</p>
---------	--



[Signature]

SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
PÁGINA 2 DE 12

[Signature]

RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

[Signature]
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO **ESTIMACIÓN:** 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

ALB-003 TABLA DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 150 KG/CM2. REFORZADO CON VR DEL NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ALMACENAJE, ACARREO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, COLOCACIÓN, AMARRES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.



[Signature]
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 3 DE 12

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CÉCOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETERIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSA:	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO **ESTIMACIÓN:** 04 CANTIDADES ADICIONALES "EINICUITO"

ALB-004 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CLASE I, ZONA B, A BORDE DE CEPA EN TRAMOS, INCLUYE: ACARREO HASTA UNA ESTACION DE 20.00, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, NIVELACION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.



[Signature]
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 4 DE 12

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO

ESTIMACIÓN: 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINQUITO"

ALB-005 PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR, FABRICADA CON CONCRETO F C=100KG/CM2 T.M.A DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

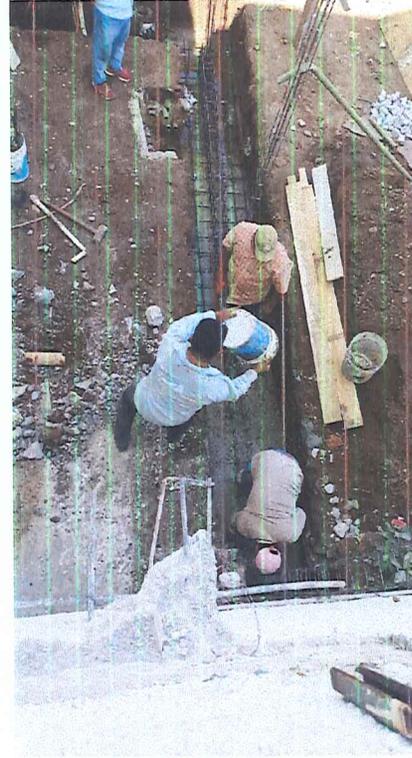

[Signature]
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 5 DE 12

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CÉCOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSA:	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO **ESTIMACIÓN:** 04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

ALB-009 PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, FC=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ACABADO SEPILLADO PARA RECIBIR LOZETA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.



[Signature]
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 6 DE 12

[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSA:	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO	ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

ALB-010 CADENA DE CERRAMIENTO CON DIMENSIONES DE 20 X15 CM. ARMADO CON 4 VR DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CM CONCRETO F'c= 200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.



[Signature]
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 7 DE 12

[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETERIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSA:	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2023	PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO
		ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINQUITO"

ALB-011 CADENA DE CONFINAMIENTO INTERMEDIO CON DIMENSIONES DE 12 X 12 CM. ARMADO 3 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRO @20 CM CONCRETO F'c= 200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIÁMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.



[Signature]
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 8 DE 12

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA, VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS	LOCALIDAD: VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL		MUNICIPIO: CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB 23300A	
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

PERIODO ESTIMADO: 01 AL 26 DE MAYO **ESTIMACIÓN:** U4 CANTIDADES ADICIONALES "FINICUITO"

ALB-012

CASTILLO CON DIMENSIONES DE 15 X15CM. ARMADO CON ARMEX 12X12-4 REFORZADO CON 2 VR 3/8 CONCRETO F'c= 200KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U.O.T.



[Handwritten Signature]
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Handwritten Signature]
SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMÍREZ VALENCIA
 PÁGINA 9 DE 12

[Handwritten Signature]
RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACIÓN (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA, VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETERIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSA	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2023	PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO
		ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINICLITO"

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

ALB-014

ENCONFRADO PARA BAJANTE SANITARIO. ARMADO CON ARMEX 10X10 CONCRETO F' C= 150KG/CM2, T.M.A. DE 19MM DE 3/4" DE DIAMETRO, DE ALTURA VARIABLE, INCLUYE: DE TUBO DE PVC DE 4", SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.



Emmanuel Bernardo Santos

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

Rodrigo Ramirez Valencia

SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
PÁGINA 10 DE 12

Vicente Sánchez García

RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO

DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACIÓN (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSAB	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2023	PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO
		ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"

INSTALACIONES ELECTRICAS

ELEC-002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRA FLEXIBLE DE LED, VOLTAJE 127V PARA LUZ INDIRECTA EN ESPEJO, INCLUYE: CABLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CCNEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS Y DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.



[Handwritten Signature]

SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

[Handwritten Signature]

SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
PÁGINA 11 DE 12

[Handwritten Signature]

RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA

ALBUM FOTOGRÁFICO


DIEGO BOCANEGRA LEAL

OBRA:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE COMUNICACION (CECOM) EN LA ZONA DE LA CULTURA. VILLAHERMOSA, TABASCO.		
AREA:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LOCALIDAD:	VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONTRATISTA:	DIEGO BOCANEGRA LEAL	MUNICIPIO:	CENTRO.
CONTRATO No.:	CO-UJAT-SSA-AD02-ES/23	UNIDAD RESPONSA:	23300A
PROGRAMA:	2.5351E1	OFICIO AUT. INV.	SF/AP/0045-3/2023
FONDO:	11021800	FECHA:	07 DE FEBRERO DE 2023
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2023	PERIODO ESTIMADO:	01 AL 26 DE MAYO
		ESTIMACIÓN:	04 CANTIDADES ADICIONALES "EINQUILITO"

ACABADOS

ACA-003

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

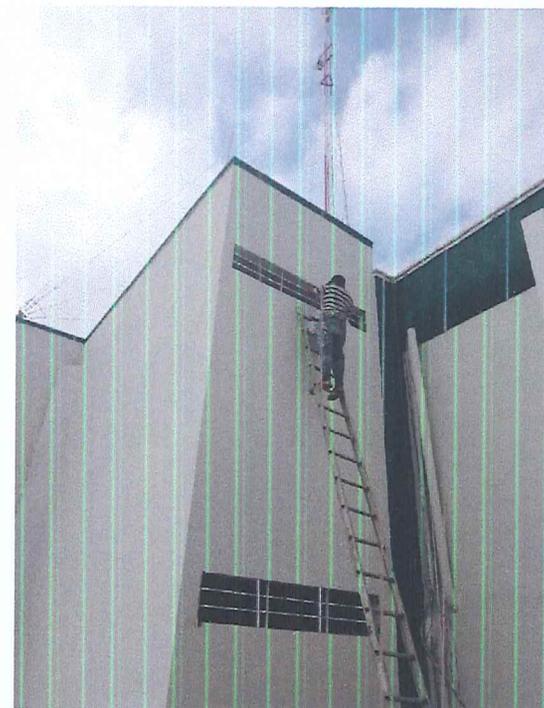

Emmanuel Bernardo Santos
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ING. EMMANUEL BERNARDO SANTOS

Rodrigo Ramirez Valencia
SUPERVISOR DE OBRA
ING RODRIGO RAMIREZ VALENCIA
 PÁGINA 12 DE 12

Vicente Sanchez Garcia
RESIDENTE DE OBRA
ING. VICENTE SÁNCHEZ GARCÍA
